



# **Banedanmarks Netredegørelse 2025 – Bilag 3.5A**

# Bilag 3.5A

## Indhold

## Side

---

### 1. Fjernbanen

Oversigt over Fjernbanen

3 - 5

TIB 1 – 35

7 - 19

### 2. S-banen

Oversigt over S-banen

6

TIB 810 – 880

20 - 21





## Fjernbanen TIB 23 - 26

Netredegerelse 2025 - overblik 2025

-  (Børkop) - Fredericia  
Vejadgang til DSB værksted
-  (Hørning) - Aarhus / (Brabrand) - Aarhus  
Ombygning Aarhus H
-  Frederikshavn – Sindal  
Sporfornyelse Kvissel
-  Tinglev - Padborg  
Vedligehold





# Fjernbanen TIB 29 - 35

Netredegørelse 2025 - overblik 2025


- Esbjerg - (Lunderskov)  
Bramming – Tønder  
Esbjerg - Spangsbjerg  
Ibrugtagning af Signalprogrammet
- (Holstebro) - (Vemb)  
(Holstebro) - (Skjern)  
(Vemb) - (Skjern)  
(Aulum) - Holstebro  
Sporformyelse Skjern – Holstebro
- Holstebro + Skjern  
Etablering af ladestandere
- (Funder) – (Silkeborg)  
Afvanding
- (Funder) – (Engesvang)  
Dæmningsudbedring



# S-banen

Netredegørelse 2025 - overblik 2025

- Svanemøllen - Hillerød  
Spor- og broarbejde
- (Ballerup) – Veksø  
Stiunderføring
- (Bispebjerg) - Fuglebakken  
Renovation af Nørrebro St

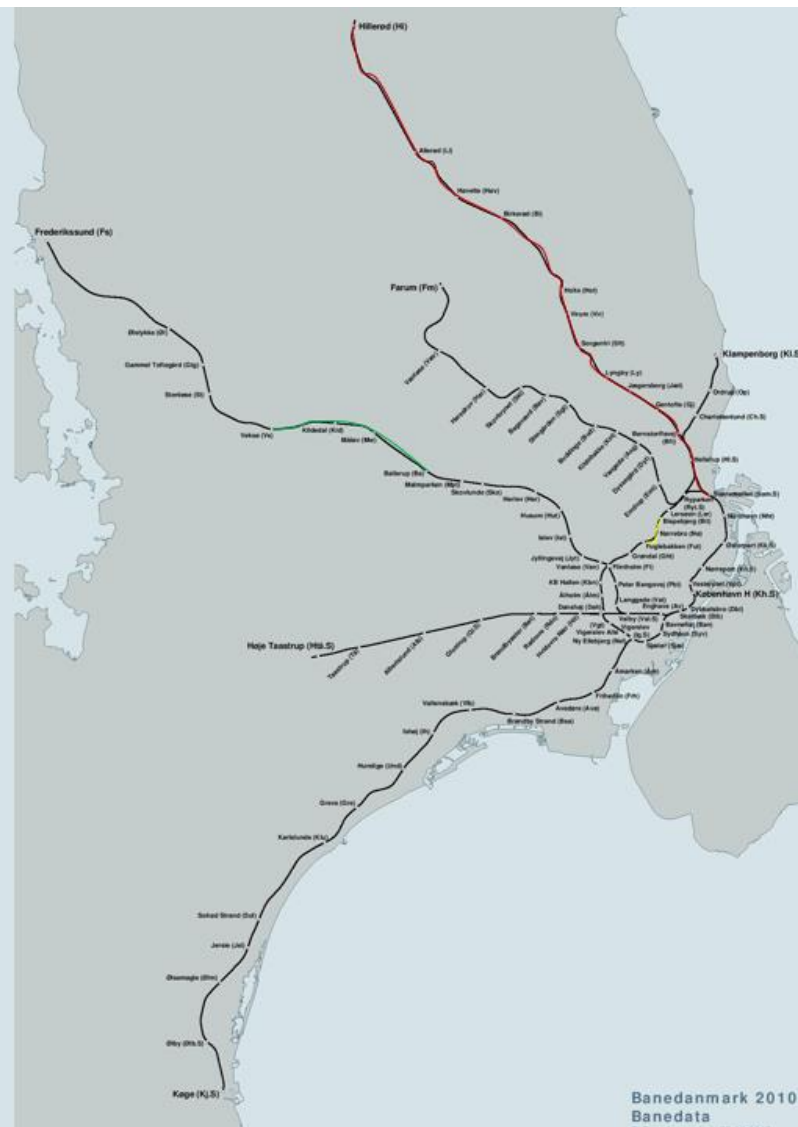

Lb.nr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
1	1	<b>Høje Taastrup – (Roskilde)</b>	Sporfornyelse Høje Taastrup	Sporarbejder Høje Taastrup station Spor 1 (før perron)	5 døgn og 12 timer		23.03 - 29.03 Stadie 0	1. Hovedspor Høje Taastrup - Roskilde spærret	Banedanmark	High
2	1	<b>Høje Taastrup – (Roskilde)</b>	Sporfornyelse Høje Taastrup	Sporarbejder Høje Taastrup station Spor 3, 4 og 5	10 døgn		29.03 - 07.04 Stadie 1a	Spor 3, 4 og 5 spærret. 3. og 4. hovedspor Høje Taastrup – Roskilde spærret	Banedanmark	High
3	1	<b>(Høje Taastrup) – (Roskilde)</b>	Sporfornyelse Høje Taastrup-Roskilde	Broarbejder bro 15232 Hedehusene Hovedgaden	21 døgn		29.03 - 19.04	3. og 4. hovedspor Høje Taastrup – Roskilde spærret	Banedanmark	High
4	1	<b>Høje Taastrup – (Roskilde)</b>	Sporfornyelse Høje Taastrup	Sporarbejder Høje Taastrup station Spor 3, 4 og 5	39 døgn		07.04 - 15.05 Stadie 1b	Spor 4 og 5 spærret 3. og 4. hovedspor Høje Taastrup – Roskilde spærret	Banedanmark	High
5	1	<b>Høje Taastrup – (Roskilde)</b>	Sporfornyelse Høje Taastrup	Sporarbejder Høje Taastrup station Spor 2 og 3	40 døgn		15.05 - 23.06 Stadie 2	Spor 2 og 3 spærret 2. og 3. hovedspor Høje Taastrup – Roskilde spærret. Adgang til spor 0 til/fra Roskilde kun til/fra 1 hovedspor	Banedanmark	High
6	1	<b>Høje Taastrup – (Roskilde)</b>	Sporfornyelse Høje Taastrup	Sporarbejder Høje Taastrup station Spor 1	4 døgn		23.05 - 26.05 Stadie 2a	Spor 1 spærret 1. hovedspor Høje Taastrup - Roskilde spærret, Adgang til/fra spor 0 kun i Glostrup ende af stationen	Banedanmark	High
7	1	<b>Høje Taastrup – (Roskilde)</b>	Sporfornyelse Høje Taastrup	Sporarbejder Høje Taastrup station Spor 1	4 døgn		30.05 - 02.06 Stadie 2a	Spor 1 spærret 1. hovedspor Høje Taastrup - Roskilde spærret, Adgang til/fra spor 0 kun i Glostrup ende af stationen	Banedanmark	High

Lb.nr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
8	1	<b>Høje Taastrup – (Roskilde)</b>	Sporfornyelse Høje Taastrup	Sporarbejder Høje Taastrup station Spor 1	4 døgn		06.06 - 09.06 Stadie 2a	Spor 1 spærret 1. hovedspor Høje Taastrup - Roskilde spærret, Adgang til/fra spor 0 kun i Glostrup ende af stationen	Banedanmark	High
9	1	<b>Høje Taastrup – (Roskilde)</b>	Sporfornyelse Høje Taastrup	Sporarbejder Høje Taastrup station Spor 1	4 døgn		13.06 - 16.06 Stadie 2a	Spor 1 spærret 1. hovedspor Høje Taastrup – Roskilde spærret, Adgang til/fra spor 0 kun i Glostrup ende af stationen	Banedanmark	High
11	1	<b>Høje Taastrup – (Roskilde)</b>	Sporfornyelse Høje Taastrup	Sporarbejder Høje Taastrup station Spor 1 og 2	6 døgn		07.07 - 12.07 Stadie 3a	Spor 1 Spærret Spor 2 spærret 2. hovedspor Høje Taastrup - Roskilde spærret. Adgang til combiterminal påvirkes ikke.	Banedanmark	High
12	1	<b>Høje Taastrup – (Roskilde)</b>	Sporfornyelse Høje Taastrup	Sporarbejder Høje Taastrup station Spor 0, 1 og 2	10 døgn		12.07 - 21.07 Stadie 3b	Spor 0, 1 og 2 spærret. 1. og 2. hovedspor Høje Taastrup - Roskilde spærret. Ingen adgang til combiterminal i perioden	Banedanmark	High
13	1	<b>Høje Taastrup – (Roskilde)</b>	Sporfornyelse Høje Taastrup	Sporarbejder Høje Taastrup station Spor 1 og 2	35 døgn		21.07 - 31.08 Stadie 3c	Spor 1 og 2 spærret. 1. og 2. hovedspor Høje Taastrup - Roskilde spærret.	Banedanmark	High
14	1	<b>(Høje Taastrup) – (Roskilde)</b>	Sporfornyelse Høje Taastrup-Roskilde	Broarbejder bro 15232 Hedehusene Hovedgaden	21 døgn		07.07 - 28.07	1. og 2. hovedspor Høje Taastrup - Roskilde spærret	Banedanmark	High



Lb.nr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
15	1	<b>Borup - Kværkeby</b>	Roskilde – Ringsted restarbejder	Maskinel sporombygning med RPM-maskine	8 døgn og 8 timer		11.04 kl. 22:00 – 20.04 kl. 04:00	Enkeltsporsdrift	Banedanmark	High
16	1	<b>Kværkeby - Borup</b>	Roskilde – Ringsted restarbejder	Maskinel sporombygning med RPM-maskine	5 døgn		20.04 kl. 04:00 – 25.04 kl. 04:00	Enkeltsporsdrift	Banedanmark	High
17	1	<b>Viby - Roskilde</b>	Roskilde – Ringsted restarbejder	Maskinel sporombygning med RPM-maskine	7 døgn		25.04 kl. 04:00 – 01.05 kl. 04:00	Enkeltsporsdrift	Banedanmark	High
18	1	<b>Roskilde - Viby</b>	Roskilde – Ringsted restarbejder	Maskinel sporombygning med RPM-maskine	5 døgn		01.05 kl. 04:00 – 06.05 kl. 04:00	Enkeltsporsdrift	Banedanmark	High
19	1	<b>Viby - Borup</b>	Roskilde – Ringsted restarbejder	Maskinel sporombygning med RPM-maskine	4 døgn		06.05 kl. 04:00 – 10.05 kl. 04:00	Enkeltsporsdrift	Banedanmark	High
20	1	<b>Sorø – (Slagelse)</b>	NFSP0542 Ringsted – Slagelse Hastighedsopgradering og sporfornyelse	Forberedelse til indbygning af nyt sporskifte i Sorø. Dele af Sorø spor 1 spærret.	5 døgn og 8 timer		16.04 kl. 20:00 – 22.04 kl. 04:00	Enkeltsporsdrift	Banedanmark	Medium
21	1	<b>(Ringsted) – (Fjenneslev)</b>	NFSP0542 Ringsted – Slagelse hastighedsopgradering og sporfornyelse	Sporfornyelse	16 døgn og 8 timer		24.05 kl. 20:00 – 11.06 kl. 04:00	Enkeltsporsdrift LA80 i nabospor, LA40 i nabospor maks. 400 meter	Banedanmark	Major
22	1	<b>Fjenneslev – (Ringsted)</b>	NFSP0542 Ringsted – Slagelse hastighedsopgradering og sporfornyelse	Sporfornyelse	11 døgn		11.06 kl. 04:00 – 22.06 kl. 04:00	Enkeltsporsdrift LA80 i nabospor, LA40 i nabospor maks. 400 meter	Banedanmark	Major

Lb.nr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
23	1	<b>(Sorø) – Fjenneslev</b>	NFSP0542 Ringsted – Slagelse hastighedsopgradering og sporfornyelse	Sporfornyelse	5 døgn		22.06 kl. 04:00 – 27.06 kl. 04:00	Enkeltsporsdrift  LA80 i nabospor, LA40 i nabospor maks. 400 meter	Banedanmark	Major
24	1	<b>Sorø st.</b>	NFSP0542 Ringsted – Slagelse hastighedsopgradering og sporfornyelse	Sporfornyelse, forlængelse af spor 3 og afvanding i Sorø	11 døgn		27.06 kl. 04:00 – 08.07 kl. 04:00	Kun drift Sorø spor 1 og 2	Banedanmark	Major
25	1	<b>(Slagelse) – (Sorø)</b>	NFSP0542 Ringsted – Slagelse hastighedsopgradering og sporfornyelse	Ballastrens	4 døgn og 16 timer		08.07 kl. 04:00 – 12.07 kl. 20:00	Enkeltsporsdrift  LA80 i nabospor, LA40 i nabospor maks. 400 meter	Banedanmark	Major
26	1	<b>(Ringsted) – Slagelse</b>	NFSP0542 Ringsted – Slagelse hastighedsopgradering og sporfornyelse	Ombygning af Sorø og sporfornyelse Fjenneslev st. spor 2.	8 døgn og 8 timer		12.07 kl. 20:00 – 21.07 kl. 04:00	Totalspærring Tog kan vende i Slagelse og Ringsted	Banedanmark	Major
27	1	<b>Sorø st.</b>	NFSP0542 Ringsted – Slagelse hastighedsopgradering og sporfornyelse	Sporombygning og afvanding Sorø. spor 1 og 2	21 døgn		21.07 kl. 04:00– 11.08 kl. 04:00	Kun drift i spor 3 på Sorø St. Spor 1 og 2 spærret ved perron	Banedanmark	Major

Lb.nr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
28	1	<b>(Odense) - Kavslunde</b>	Ny Bane over Vestfyn	Nedrivning af bro 20376. Arbejder i kørestrømsanlæg (Kavslunde) Spor-, jord- og afvandingsarbejder (Odense-Holmstrup)	5 døgn og 8 timer		16.04 kl. 20:00 – 22.04 kl. 04:00	Totalspærring	Vejdirektoratet/Banedanmark	High
29	1	<b>(Holmstrup) – (Odense)</b>	Ny Bane over Vestfyn	Jord- og afvandingsarbejder	22 døgn		22.04 kl. 04:00 – 13.05 kl. 04:00	Enkeltspordrift LA80 i nabospor 500m	Vejdirektoratet/Banedanmark	High
30	1	<b>(Holmstrup) – (Odense)</b>	Ny Bane over Vestfyn	Spor- og jordarbejder	4 døgn		14.08 – 17.08	Enkeltspordrift LA80 i nabospor 500m	Vejdirektoratet/Banedanmark	Medium
31	1	<b>(Middelfart)-(Fredericia)/(Taulov)</b>	Snoghøj sporskifter	Fornyelse af sporskifter	5 døgn og 8 timer		16.04 kl. 20:00 – 22.04 kl. 04:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium
32	1	<b>(Middelfart)-(Fredericia)/(Taulov)</b>	Snoghøj sporskifter	Fornyelse af sporskifter	5 nætter af 12 timer		22.04 kl. 18:00 – 27.04 kl. 06:00	Totalspærring nat	Banedanmark	Medium
33	1	<b>(Middelfart)-(Fredericia)/(Taulov)</b>	Snoghøj sporskifter	Fornyelse af sporskifter	18 døgn og 22 timer		22.06 kl. 22:00 – 11.07 kl. 20:00	Enkeltsporsdrift Middelfart – Snoghøj – Fredericia / Taulov	Banedanmark	Major

Lb.nr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
34	1	<b>(Middelfart)- (Fredericia)/ (Taulov)</b>	Snoghøj sporskifter	Fornyelse af sporskifter	2 døgn og 8 timer		11/7 kl. 20:00 – 14/7 kl. 04:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium
35	1	<b>(Taulov)/ (Fredericia)- (Middelfart)</b>	Snoghøj sporskifter	Fornyelse af sporskifter	21 døgn		14.07 kl. 04:00 – 04.08 kl. 04:00	Enkelspørdrift Fredericia / Taulov – Snoghøj – Middelfart	Banedanmark	Major
36	1	<b>(Middelfart)- (Fredericia)/ (Taulov)</b>	Snoghøj sporskifter	Fornyelse af sporskifter	15 nætter		22.06 – 11.07 14.07 - 04.08	Totalspærring af Snoghøj 15 nætter á 10 timer indenfor perioderne	Banedanmark	Major
37	2	<b>Rødby Færge – Nykøbing Falster Vest</b>	Ringsted Femern Banen, Fase II	Udvidelse til to spor og forbindelse til Femern forbindelsen	Hele året		01.01 – 31.12 Frem til 2029	Totalspærring ekskl. Lollandsbanen	Banedanmark	Major
38	2	<b>Nykøbing F – Nykøbing F Vest</b>	RFB - E3006 Ny Kong Frederik IX's bro	Broarbejder ved ny Frederik IX's bro (montage af klapfag)	5 døgn		09.01 – 13.01	Totalspærring for Lokaltog mellem Nykøbing F og Nykøbing F. Vest.  Tog fra Næstved kan komme til Nykøbing F.  Spærret fra Mrk-NF236 til Mrk- NFV214	Banedanmark	Medium



Lb.nr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
39	2	<b>Nykøbing F - Nykøbing F Vest</b>	RFB - E3006 Ny Kong Frederik IX's bro	Broarbejder ved ny FiX (SAT 2)	3 døgn		09.05 – 12.05	Totalspærring for Lokaltog mellem Nykøbing F og Nykøbing F. Vest. Tog fra Næstved kan komme til Nykøbing F. Spærret fra Mrk-NF236 til Mrk-NFV214	Banedanmark	Medium
40	10	<b>København H – Østerport</b>	Afvandingsarbejde	Afvandingsarbejde	2 døgn, 4 timer og 40 minutter		03.01 kl. 23:40 - 06.01 kl. 04:20	Totalspærring Kh-Kk-Kh begge hovedspor. Der vil være mulighed for at åbne 2.hsp for DSB ca. hver 6 time for placering af materiel.	Banedanmark	Medium
41	11	<b>Københavns Lufthavn Kastrup station</b>	Ny Kastrup Lufthavn Station	Sporarbejde, kørestrømsarbejder Perronforkanter, spunsning	225 døgn, 12 timer og 30 minutter		02.01 kl. 04:30 – 15.08 kl. 17:00	Døgnspærring spor 11 og 12 Spor 12: SU122 – sporskifte 12(EKSL) Spor 11: sporskifte 05 – SU111	Sund og bælt A/S	High
42	11	<b>Københavns Lufthavn Kastrup station</b>	Ny Kastrup Lufthavn Station	Slutjustering + montage af stillads til elevatorer	1 døgn		29.09 kl. 04:30 – 30.09 kl. 04:30	Døgnspærring spor 11 og 12 Spor 12: SU122 – Sporskifte 12(EKSL) Spor 11: sporskifte 05 – SU111	Sund og bælt A/S	Medium
43	11	<b>Københavns Lufthavn Kastrup station</b>	Ny Kastrup Lufthavn Station	Demontage af stillads, brøløft og montage af bro, indhejsning og montage af trapper, rulletrapper, pergularammer	28 døgn og 10 timer		16.10 kl. 07:00 - 13.11 kl. 17:00	Døgnspærring spor 11 og 12 Spor 12: SU122 – Sporskifte 12(EKSL) Spor 11: sporskifte 05 – SU111	Sund og bælt A/S	Major
44	11	<b>Kastrup station, spor 1 og 2</b>	Signalprogrammet	Installationsarbejder	4 døgn		19.09 – 22.09	Spor 1 og 2 spærret	Banedanmark	Medium

Lb.nr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
45	11	<b>Kastrup station, spor 1 og 2</b>	Signalprogrammet	Installationsarbejder	4 døgn		03.10 – 06.10	Spor 1 og 2 spærret	Banedanmark	Medium
46	11	<b>Kastrup station, spor 11 og 12</b>	Signalprogrammet	Installationsarbejder	4 døgn		12.09- 15.09	Spor 11 og 12 spærret	Banedanmark	Medium
47	11	<b>Kastrup station</b>	Signalprogrammet	Installationsarbejder	4 døgn		05.09- 08.09	Adgang til klargøringscentret spærret	Banedanmark	Medium
48	11	<b>Peberholm – (Kastrup lufthavn)</b>	Totalspærring imellem Sverige og Danmark	Vedligehold	2 døgn		15.03 kl. 00.01 – 16.03 kl. 23.59	Totalspærring	Øresundsbroen	Medium
49	11	<b>Peberholm – (Kastrup lufthavn)</b>	Totalspærring imellem Sverige og Danmark	Vedligehold	1 døgn		08.11 kl. 13:00 – 09.11 kl. 13:00	Totalspærring	Øresundsbroen	Medium
50	21	<b>(Odense) – Svendborg</b>	Signalprogrammet	Indbygning af SP på sporskifter og overkørsler	9 weekender af 2 døgn og 8 timer	1. - 2. kvartal	01.01 – 30.06	Totalspærring	Banedanmark	Medium
51	21	<b>(Odense) – Svendborg</b>	Signalprogrammet	Ibrugtagning	21 døgn i perioden	3. kvartal	01.07 – 30.09	Totalspærring	Banedanmark	High

Lb.nr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
52	23	<b>(Børkop) - Fredericia</b>	Vejadgang til DSB-værksted	Broarbejder Børkop-Fredericia	46 døgn		06.06 – 21.07	Spærring af spor 9, 302 og 303 Enkeltsporsdrift Børkop – Fredericia, samt begrænsninger i rangering på Fredericia rangerbanegård	Banedanmark	Major
53	23	<b>(Børkop) - Fredericia</b>	Vejadgang til DSB-værksted	Broarbejder Børkop-Fredericia	3 nætter		25.08 – 28.08	Natspærringer 11t + 11t + 9t af spor 303, Enkeltsporsdrift Børkop – Fredericia samt begrænsninger i rangering på Fredericia rangerbanegård	Banedanmark	Medium
54	23	<b>(Børkop) - Fredericia</b>	Vejadgang til DSB-værksted	Broarbejder Børkop-Fredericia	3 nætter		26.09 – 29.09	Natspærringer 11t + 11t + 9t af spor 303, Enkeltsporsdrift Børkop – Fredericia samt begrænsninger i rangering på Fredericia rangerbanegård	Banedanmark	Medium
55	23	<b>(Hørning) - (Skanderborg)</b>	Sporudretning ved kommende Stilling trinbræt	Sideflytning af spor	6 timer		15.04 kl. 22:00 - 16.04 kl. 04:00	Enkeltsporsdrift	Banedanmark	Minor
56	23	<b>(Hørning) - (Skanderborg)</b>	Sporudretning ved kommende Stilling trinbræt	Sideflytning af spor	2 døgn og 4 timer		17.04 kl. 01:00 - 19.04 kl. 21:00	Enkeltsporsdrift	Banedanmark	Medium
57	23	<b>(Skanderborg) - (Hørning)</b>	Sporudretning ved kommende Stilling trinbræt	Sideflytning af spor	9 timer		19.04 kl. 21:00 - 20.04 kl. 06:00	Enkeltsporsdrift	Banedanmark	Minor

Lb.nr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
58	23	<b>(Hørning) – Aarhus</b>	Kongsvangbro	Indbygning af spurs i spor 40	2 døgn og 6 timer		05.12 kl. 22:00 – 08.12 kl. 04:00	Enkeltsporsdrift Hørning – Aarhus alle tog via spor 80 til Aarhus H	Banedanmark	Medium
59	23	<b>Aarhus H</b>	Ombygning Aarhus H	Perron, bro og sporarbejde	134 døgn		09.12 2024 – 21.04	Spor 6 og spor 7 er spærret. Ingen parkering ved perron	Banedanmark	Major
60	23	<b>Aarhus H</b>	Ombygning Aarhus H	Perron, bro og sporarbejde	236 døgn		21.04 - Fortsætter ind i K26	Spor 4, 5, 6 og 7 spærret + spor 40 fra spsk 02 ekskl. + spor 50 fra spsk 01 ekskl. til spor 4, 5, 6, 7 Kun trafik i spor 2 og spor 3, samt kørsel via spor 40 / spor 40/80 fra Hørning	Banedanmark	Major
61	23/24	<b>Aarhus H</b>	Ombygning Aarhus H	sporarbejde + Signalprogram	276 døgn		24.11 - Fortsætter ind i K26	Et spor ombygges ad gangen i spor gr 6xx, 7xx, 8xx, et spor tages ud af drift ad gangen	Banedanmark	Major
62	24	<b>Aarhus H</b>	Ombygning Aarhus H	Perron, bro og sporarbejde	134 døgn		09.12.2024 – 21.04	Spor 6 og spor 7 er spærret. Der kan ikke parkeres ved perron	Banedanmark	Major
63	24	<b>Aarhus H</b>	Ombygning Aarhus H	Perron, bro og sporarbejde	216 døgn		21.04 - 23.11	Spor 4, 5, 6 og 7 spærret, Kun trafik i spor 2 og spor 3, samt kørsel via spor 40 / spor 40/80 fra Hørning	Banedanmark	Major
64	24	<b>(Brabrand) – Aarhus H</b>	Ombygning af Aarhus H	Perron, bro og sporarbejde + SP	21 døgn		23.11 – 13.12	Spor 4, 5, 6 og 7 spærret, + spor 30 fra dværg signal D301 til I-signal I301 + strækning Brabrand ekskl. til Aarhus er spærret. Enkeltsporsdrift	Banedanmark	Major



Lb.nr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
65	25	<b>Frederikshavn – Sindal</b>	Sporfornyelse Kvissel	Sporarbejde	2 døgn og 8 timer		25.07 kl. 20:00 – 28.07 kl. 04:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium
66	25	<b>Kvissel Station</b>	Sporfornyelse Kvissel	Sporarbejde	20 døgn, 16 timer		28.07 kl. 04:00 – 22.08 kl. 20:00	Enten er spor 1 eller spor 2 spærret. Ingen krydsning	Banedanmark	High
67	25	<b>Frederikshavn – Sindal</b>	Sporfornyelse Kvissel	Sporarbejde	2 døgn og 8 timer		08.08 kl. 20:00 – 11.08 kl. 04:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium
68	25	<b>Frederikshavn – Sindal</b>	Sporfornyelse Kvissel	Sporarbejde	2 døgn og 8 timer		22.08 kl. 20:00 – 25.08 kl. 04:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium
69	26	<b>Tinglev - Padborg</b>	Diverse skinne og svejse opgaver	Vedligeholdelses spærringer til svejse- og skinneopgaver samles og kræver totalspærring i Padborg og på strækningen Padborg - Tinglev	4 døgn		06.06 – 09.06	Totalspærring	Banedanmark	Medium
70	29	<b>Esbjerg – (Lunderskov)</b>	Signalprogram	Ibrugtagning signalprogram	10 døgn og 8 timer		11.04 kl. 20:00 – 22.04 kl. 04:00	Totalspærring	Banedanmark	High

Lb.nr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelser	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
71	30	<b>(Ribe) – Tønder Grænse</b>	Signalprogram	Ibrugtagning signalprogram	21 døgn		21.03 kl. 20:00 – 11.04 kl. 20:00	Totalspærring	Banedanmark	High
72	30	<b>Bramming – Tønder Grænse</b>	Signalprogram	Ibrugtagning signalprogram	10 døgn og 8 timer		11.04 kl. 20:00 – 22.04 kl. 04:00	Totalspærring	Banedanmark	High
73	31	<b>Esbjerg – (Varde)</b>	Signalprogram	Ibrugtagning signalprogram	24 døgn og 4 timer		29.03 kl. 00:00 – 22.04 kl. 04:00	Totalspærring	Banedanmark	High
74	31	<b>(Holstebro) – (Vemb)</b>	Sporfornyelse Skjern – Holstebro	Ny sporkasse, Skinne- og svelleudveksling, ballastrensning, renovering af gennemløb m.m.	35 døgn		01.03 – 04.04	Totalspærring	Banedanmark	Major
75	31	<b>(Holstebro) – (Skjern)</b>	Sporfornyelse Skjern – Holstebro	Sporskifter og generel sporfornyelse på Vemb station, omisolering af Tim Å og Store Å broer, opstart af perronfornyelse Lem st. SP-ibrugtagning.	30 døgn, 4 timer		05.04 kl. 00:00 – 05.05 kl. 04:00	Totalspærring	Banedanmark	Major
76	31	<b>(Vemb) – (Skjern)</b>	Sporfornyelse Skjern – Holstebro	Ny sporkasse, Skinne- og svelleudveksling, ballastrensning, renovering af gennemløb m.m. Færdiggørelse af Lem st. perronarbejder	69 døgn		05.05 kl. 04:00 – 14.07 kl. 04:00	Totalspærring	Banedanmark	Major

Lb.nr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelser	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
77	31 + 33	<b>Holstebro</b>	Etablering af ladestandere	Opsætning af batteriladere	65 døgn, 4 timer		01.03 kl. 00:00 – 05.05 kl. 04:00	Der spærres spor 2 og spor 3 på Holstebro st., Der kan ikke krydses på Holstebro st.	Banedanmark	High
78	31 + 35	<b>Skjern</b>	Etablering af ladestandere	Opsætning af batteriladere	99 døgn, 4 timer		05.04 kl. 00:00 – 14.07 kl. 04:00	Der spærres max 2 spor ad gangen på Skjern st. Der vil altid kunne køre tog fra Esbjerg – Skjern-Herning og retur. Der kan ikke krydses på Skjern St.	Banedanmark	High
79	33	<b>(Aulum) – Holstebro</b>	Sporfornyelse Skjern – Holstebro	Ny sporkasse, skinne- og svelleudveksling, ballastrensning	2 døgn og 4 timer		01.03 kl. 00:00 – 03.03 kl. 04:00	Totalspærring imellem Aulum og Holstebro. Tog til/fra Struer kan vende i spor 1	Banedanmark	Medium
80	33	<b>(Aulum) – Holstebro</b>	Sporfornyelse Skjern – Holstebro	Ny sporkasse, skinne- og svelleudveksling, ballastrensning	6 nætter indenfor følgende periode		03.03 kl. 17:00 – 04.05 kl. 05:00	Kun Nat: Totalspærring imellem Aulum og Holstebro. Tog til/fra Struer kan vende i spor 1	Banedanmark	Medium
81	34	<b>Struer - Hvidbjerg</b>	Malingsentreprise Oddesundbroen	Maling og broarbejder Oddesundbroen	4 døgn		28.03 – 31.03	Totalspærring	Banedanmark	Medium
82	34	<b>Struer - Hvidbjerg</b>	Malingsentreprise Oddesundbroen	Maling og broarbejder Oddesundbroen	4 døgn		13.06 – 16.06	Totalspærring	Banedanmark	Medium
83	35	<b>(Funder) - (Engesvang)</b>	Funder bakke	Dæmningsudbedring	30 døgn		05.07 - 03.08	Totalspærring	Banedanmark	High
84	35	<b>(Funder) – (Silkeborg)</b>	Afvandingsarbejder	Arbejde pga. uroligt spor	30 døgn		05.07 – 03.08	Totalspærring	Banedanmark	High

Lb.nr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
1	820	<b>Bernstorffsvej - Lyngby</b>	NFSP0523 (Sam-Hi)	Spor og broarbejder Bernstorffsvej - Jægersborg	34 døgn		13.04 – 16.05	Totalspærring mellem Bernstorffsvej og Lyngby inkl. Lyngby spor 3	Banedanmark	Major
2	820	<b>(Gentofte) - Sorgenfri</b>	NFSP0523 (Sam-Hi)	Spor og broarbejder Gentofte -Sorgenfri	29 døgn		16.05 – 13.06	Totalspærring mellem Gentofte og Sorgenfri	Banedanmark	Major
3	820	<b>Holte – (Birkerød)</b>	NFSP0523 (Sam-Hi)	Spor og broarbejder Holte - Birkerød	18 døgn		14.06 – 01.07	Totalspærring mellem Holte og Birkerød	Banedanmark	Major
4	820	<b>Allerød - Hillerød</b>	NFSP0523 (Sam-Hi)	Sporskifteudveksling på Allerød station	17 døgn		02.07 – 18.07	Totalspærring Allerød - Hillerød	Banedanmark	Major
5	820	<b>(Gentofte) - Hellerup – (Svanemøllen)</b>	NFSP0523 (Sam-Hi)	Spor og broarbejder Hellerup-Gentofte	42 døgn		18.07 – 28.08	Spærring 2. hovedspor Gentofte – Hellerup, Hellerup spor 5, 6, 7, 8, 15, 16, 60 og 61 og 4. hovedspor Hellerup - Svanemøllen	Banedanmark	Major
6	820	<b>Bernstorffsvej – Gentofte – (Jægersborg)</b>	NFSP0523 (Sam-Hi)	Sporskifteudveksling på Gentofte station	6 døgn		28.08 – 02.09	Totalspærring mellem Bernstorffsvej og Jægersborg	Banedanmark	Major
7	820	<b>(Svanemøllen) - Hellerup – (Gentofte)</b>	NFSP0523 (Sam-Hi)	Spor og broarbejder Hellerup-Gentofte	35 døgn		02.09 – 14.10	Spærring 3. hovedspor Svanemøllen – Hellerup, Hellerup spor 3, 4, 5, 6, 15, 16, 60 og 61 og 1. hovedspor Hellerup - Gentofte	Banedanmark	Major
8	830	<b>(Ballerup) - Veksø</b>	1002901 Kildedal - ny stiunderføring i banedæmning (2019-20943)	Stiunderføring	12 døgn	Sommerferie 2025, uge 28 og 29	07.07 – 18.07	Totalspærring	3.part	Major
9	860	<b>Hellerup - Charlottenlund</b>	NFSP0523 (Sam-Hi)	Spor og broarbejder Hellerup-Charlottenlund	42 døgn		18.07 – 28.08	Spærring 2. hovedspor Charlottenlund – Hellerup og Hellerup spor 5, 6, 7, 8, 15, 16, 60 og 61.	Banedanmark	Major



Lb.nr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
10	860	<b>Hellerup - Charlottenlund</b>	NFSP0523 (Sam-Hi)	Spor og broarbejder Hellerup-Charlottenlund	35 døgn		02.09 – 14.10	Spærring Hellerup spor 3, 4, 5, 6, 15, 16, 60 og 61 og 3. hovedspor Hellerup - Charlottenlund	Banedanmark	Major
11	880	<b>(Bispebjerg) - Fuglebakken</b>	Renovering af Nørrebro station	Fornyelse af adgangsveje og ombygning	12 døgn	Påsken	11.04 – 22.04	Totalspærring	DSB Ejendomme	High
12	880	<b>Hellerup – (Lersøen)</b>	NFSP0523 (Sam-Hi)	Spor og broarbejder i Hellerup	42 døgn		18.07 – 28.08	Spærring Hellerup spor 5, 6, 7, 8, 15, 16, 60 og 61 og 2. hovedspor Hellerup - Lersøen		Major
13	880	<b>(Lersøen) - Hellerup</b>	NFSP0523 (Sam-Hi)	Spor og broarbejder i Hellerup	35 døgn		02.09 – 14.10	Spærring 1. hovedspor Lersøen, Hellerup og Hellerup spor 3, 4, 5, 6, 15, 16, 60 og 61 og 3. hovedspor Hellerup - Charlottenlund	Banedanmark	Major

