

ORS SSB 316–2019

Offentliggjort: 29.07.2019

Gyldig fra: 26.08.2019

Gyldig til: 31.03.2020

Strækning 820, Hillerød – Lyngby. Prøvekørsel

1. Baggrund

I forbindelse med finindstilling af Automatisk Togfremføring (ATO) skal der køres en række prøvekørsler på strækning 820 mellem Sorgenfri og Allerød, hvor de forskellige niveauer, herunder deaktivering, af funktionen ”glatte skinner” skal afprøves.

2. Generelt

Denne SSB dækker området fra afsnitsmærke Hi02 og Hi03 til afsnitsmærke Ly14 og Ly17.

På strækning 820 mellem Li04 - Ly16 og Li03 - Ly19 træder ORS SSB 301-2019 kørsel med indkoblet ”glatte skinner” midlertidigt ud af kraft under prøvekørslerne, forudsat at betingelserne nedenfor er opfyldt.

I øvrige områder er ORS SSB 301-2019 kørsel med indkoblet ”glatte skinner” gældende.

3.0 Betingelser

3.1 Prøvetog jvf. denne SSB, består udelukkende af S-togsmateriel.

3.2 Der må maksimalt befinde sig to prøvetog (et på hvert hovedspor) på strækningen imellem afsnitsmærke Hi02 - Ly16 henholdsvis afsnitsmærke og Hi03 - Ly19, på samme tid.

3.3 Der må ikke befinde sig rullende materiel eller personer imellem afsnitsmærke Ly16 - Ly14 samt Ly17 - Ly19.

3.3 Der må ikke udføres infrastrukturarbejde eller fremføres andet rullende materiel end prøvetog under testens udførelse.

3.4 Prøvetog må ikke medtage passagerer.

3.5 Der må højst være 8 personer i prøvetog. Disse personer skal have en relevant funktion for testens udførelse.

Udgivet af: Banedanmark Carsten Niebuhrs Gade 43 1577 København V	Telefon: + 45 8234 0000 Direkte: +45 2720 6846	E-mail: trafikaleregler@bane.dk Web: www.bane.dk	Journalnr. / init.: 2019 - 13208 / AJAJ CVR 18638876 Side 1 (3)
--	---	---	--

4. Testsikkerhedslederens forhold

- 4.1 Før prøve kørslen påbegyndes, skal testsikkerhedslederen indhente oplysning om, at sporskifter i henholdsvis, Holte, Birkerød og Allerød er lokal aflåst som nævnt i punkt 7.2, med henblik på at sikre, at der maksimalt befinder sig et prøvetog på hvert spor imellem afsnitsmærke og Hi02 - Ly16 henholdsvis afsnitsmærke Hi03 - Ly19 (se bilag 1, hvor de to spor er markeret med henholdsvis orange og grøn).
- 4.2 Ligeledes skal testsikkerhedslederen sikre sig, at trafiklederen på strækningen samt prøvetogslederen for hvert enkelt prøvetog, har meddelt, at de er klar til at påbegynde prøve kørslen, og at ORS SSB 301-2019 kørsel med indkoblet "glatte skinner" dermed midlertidigt er ophævet mellem Li04 - Ly16 og Li03 - Ly19, så længe testen pågår.
- 4.3 Desuden skal det sikres, at der ikke med testsikkerhedslederens vidende, befinder sig personer i sporet på strækningen, så længe prøve kørslen pågår.
- 4.4 Efter prøve kørslen skal testsikkerhedslederen meddele trafiklederen og prøvetogslederen for hvert enkelt prøvetog at prøve kørslen er afsluttet, og at ORS SSB 301-2019 kørsel med indkoblet "glatte skinner" dermed er gældende i hele området igen.

5. Prøvetogslederens forhold

Inden prøve kørslen påbegyndes skal prøvetogslederen for hvert enkelt prøvetog bekræfte overfor testsikkerhedslederen, at de er klar til at påbegynde prøve kørslen.



6. Lokomotivførerens forhold

Inden lokomotivføreren passerer afsnitsmærke Li03 henholdsvis Li04 mod Hillerød, skal lokomotivføreren sikre sig at korrekt symbol for "glatte skinner" vises i togets DMI.

7. Trafiklederens forhold

- 7.2 Sporskifter der fører ind til spor 2, 21 og 12 i Holte, spor 3 i Allerød samt spor 3 i Birkerød skal lokal aflåses i stilling der forhindrer ruteindstilling til disse spor så længe prøve kørslen pågår (Se bilag 1 hvor det indenfor det røde område kun er spor markeret med orange henholdsvis grøn, der må befares).

Bilag 1

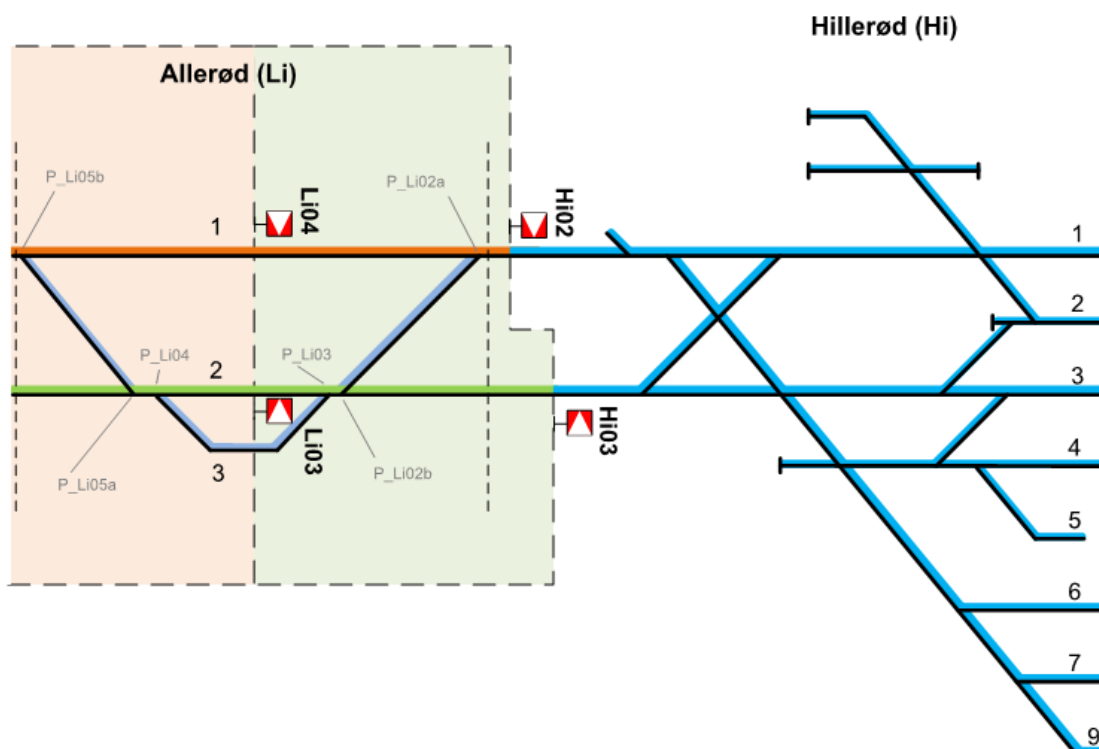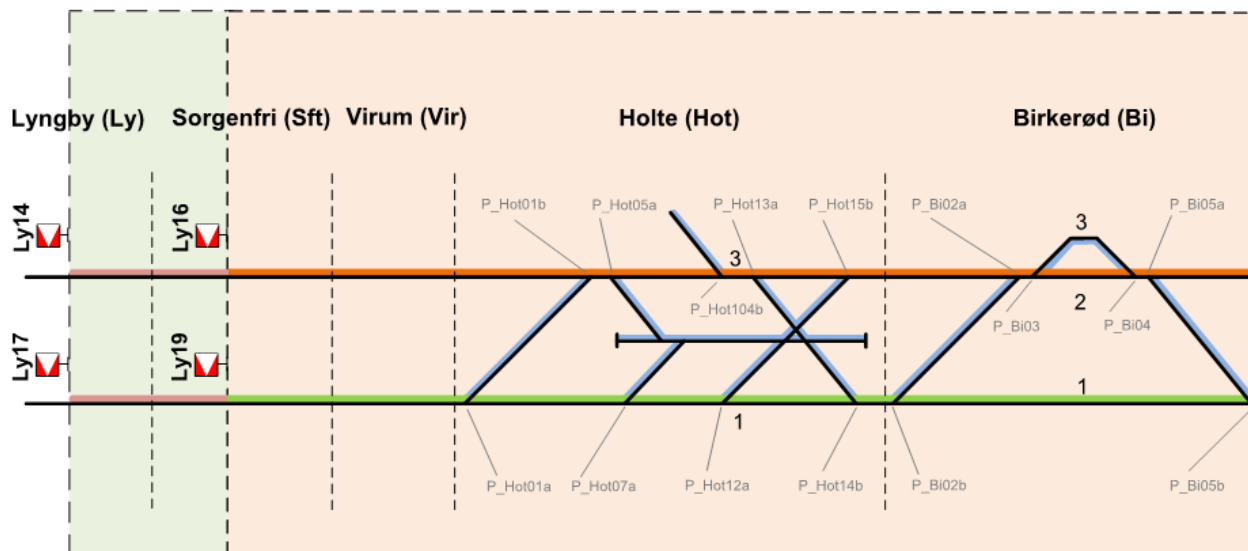

Området ikke omfattet af ORS SSB 301-2019 mens test udføres under ORS SSB 316-2019

Grænseområdet hvor der må ikke være tog eller arbejder i spor mens test udføres under ORS SSB 316-2019

Oversigt over gyldige Supplerende Sikkerhedsbestemmelser kan ses på www.bane.dk.

Udgivet af:	Telefon: + 45 8234 0000	E-mail: trafikalerregler@bane.dk	Journalnr. / init.: 2019 - 13208 / AJAJ
Banedanmark Carsten Niebuhrs Gade 43 1577 København V	Direkte: +45 2720 6846	Web: www.bane.dk	CVR 18638876 Side 3 (3)
